




■ I 期工事：令和2年度

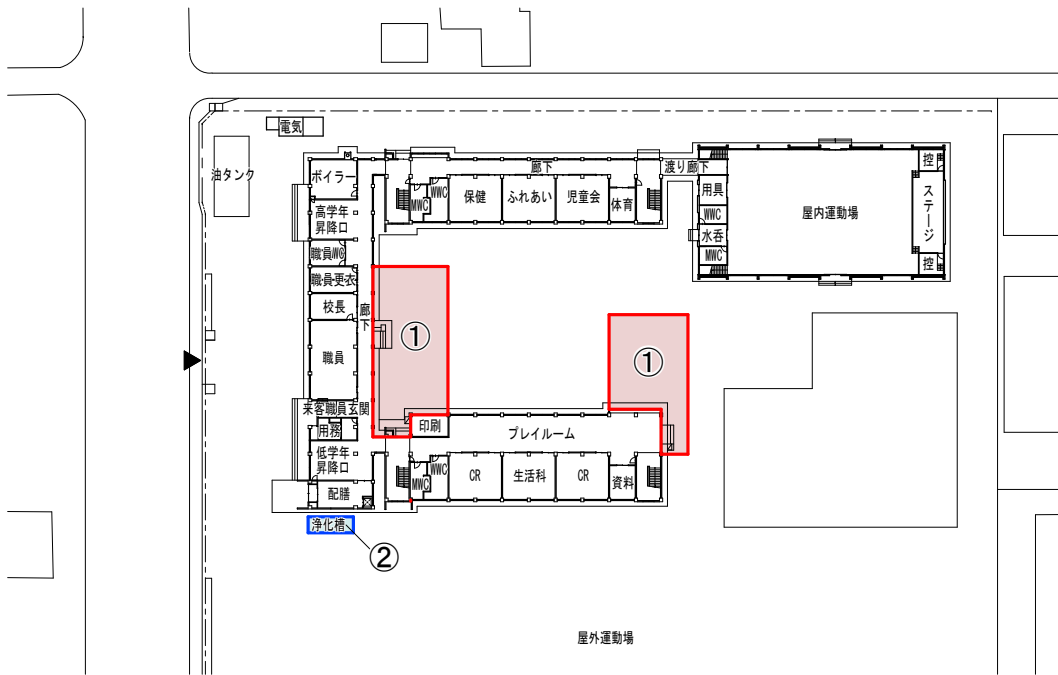


配置・1階計画図

①	令和2年7月～令和3年3月(8ヵ月)	新職員室・多目的ホール・CR増築
②	令和2年7月～令和2年8月(2ヵ月)	既存浄化槽解体

凡例 … ：解体工事範囲 ：増築・改修工事範囲 ：工事中仮配置室

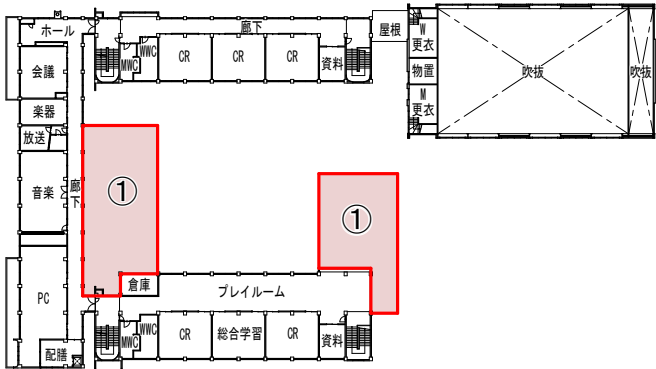


2階計画図

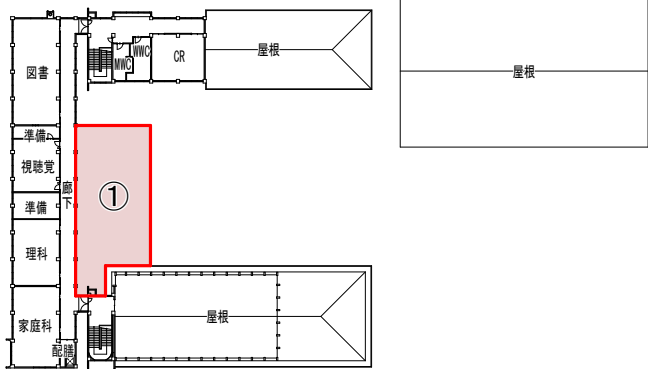

3階計画図



■ II 期工事：令和3年度

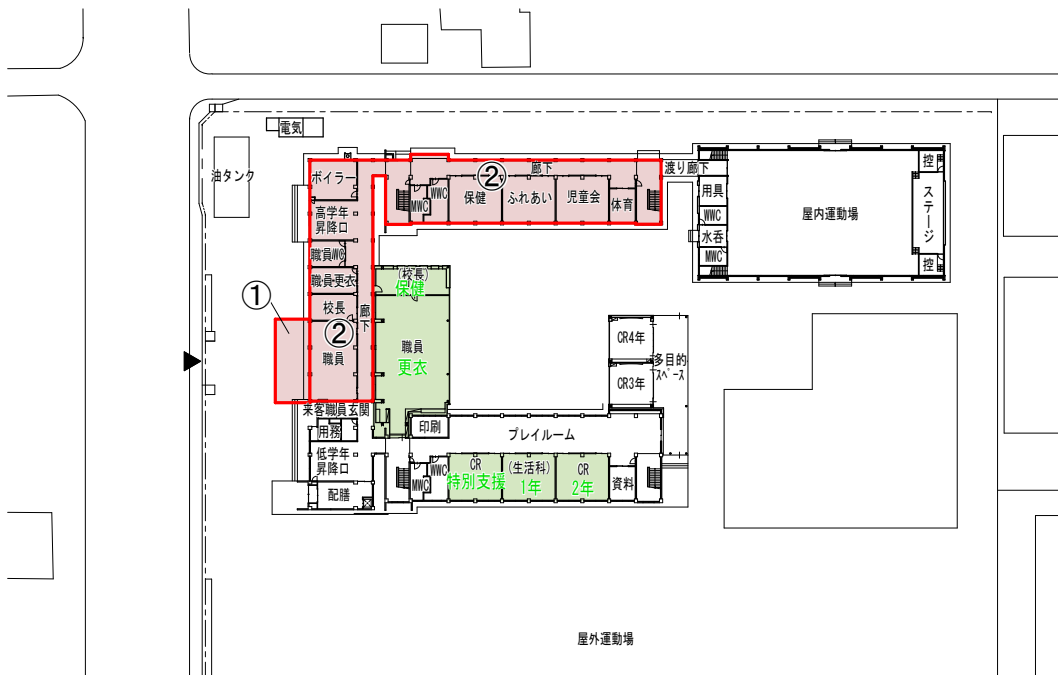


配置・1階計画図

①	令和3年7月～令和2年10月(4ヵ月)	新昇降口増築
②	令和2年8月～令和3年3月(8ヵ月)	管理棟A(南側)・高学年棟改修

凡例 … ：解体工事範囲 ：増築・改修工事範囲 ：工事中仮配置室

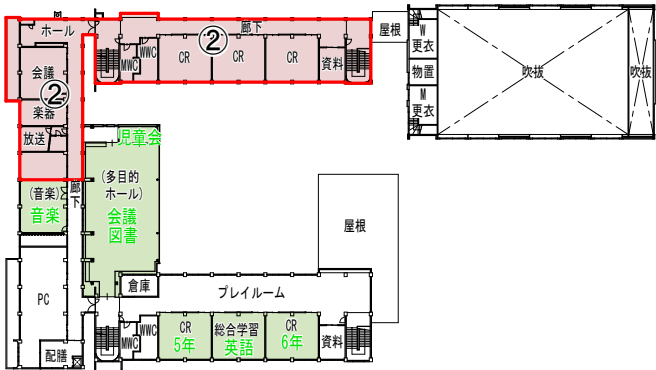

2階計画図

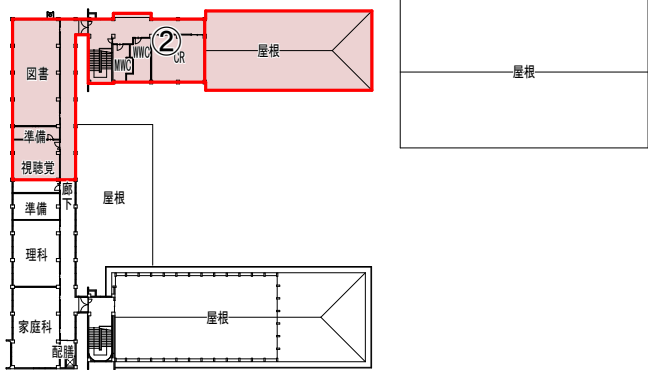


3階計画図


■Ⅲ期工事：令和4年度



配置・1階計画図

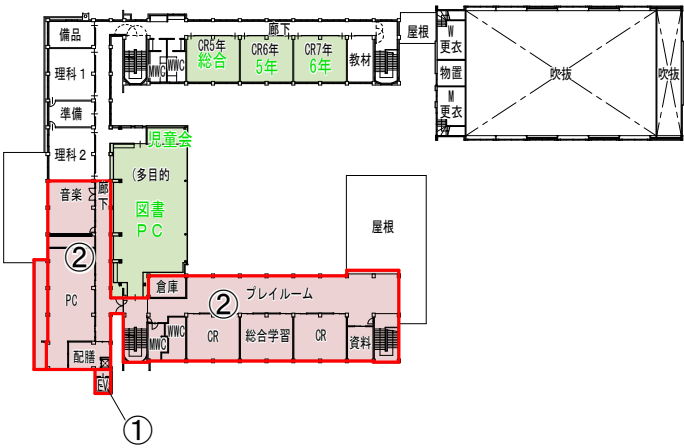


2階計画図

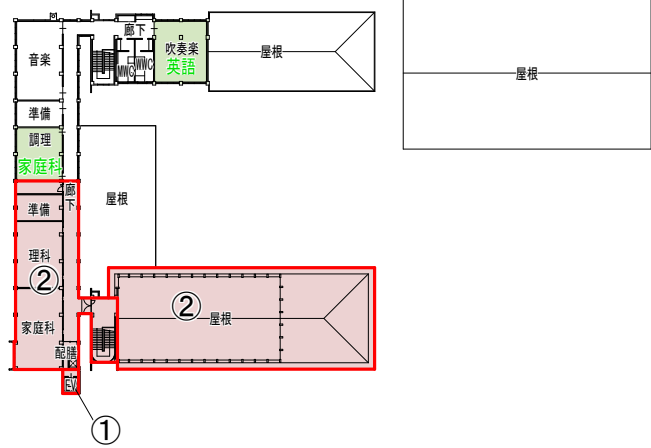


3階計画図

①	令和4年7月～令和4年10月(4ヵ月)	新エレベーター増築
②	令和4年7月～令和5年3月(9ヵ月)	管理棟B(北側)・低学年棟改修

■Ⅳ期工事：令和4年度

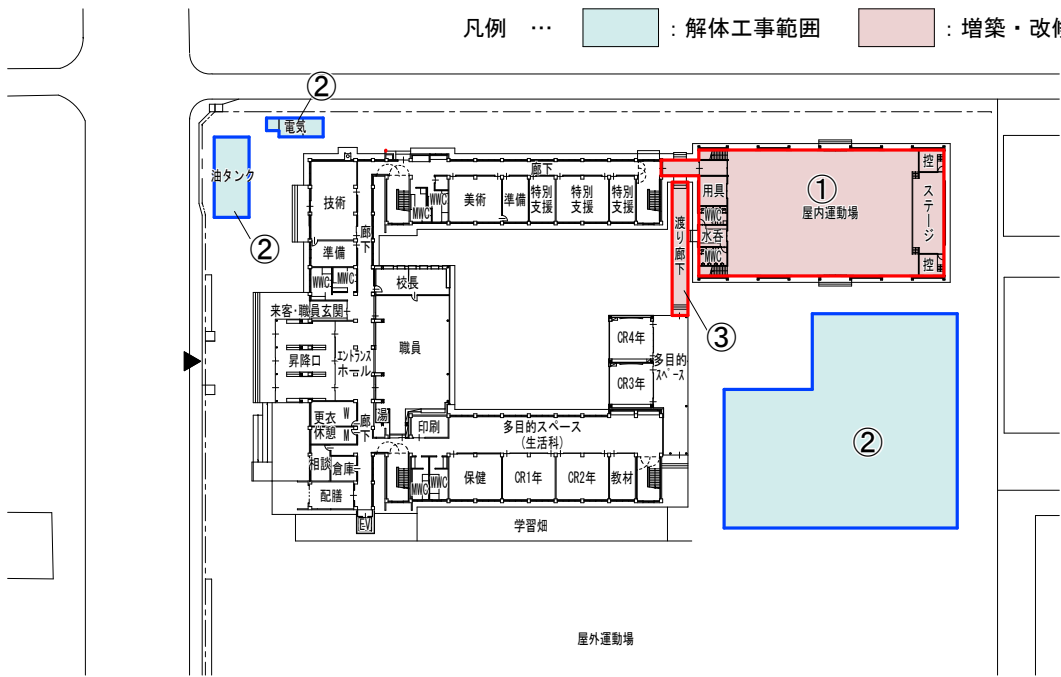

配置・1階計画図

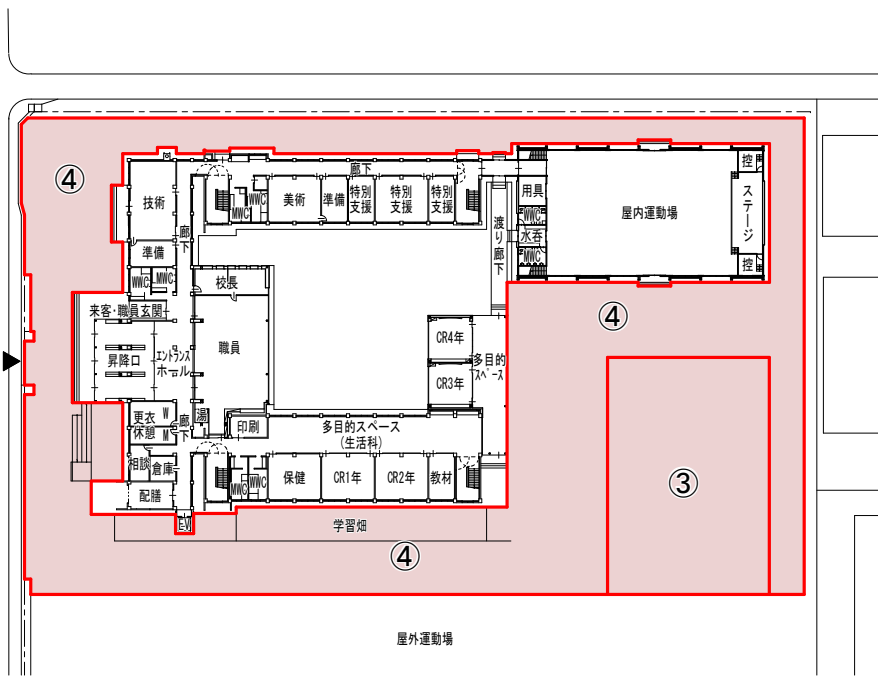

配置・1階計画図

①	令和5年1月～令和5年3月(3ヵ月)	既存体育館棟改修	④	令和4年9月～令和4年12月(3.5ヵ月)	外構工事
②	令和4年6月～令和4年8月(3ヵ月)	既存油タンク・電気室・プール解体			
③	令和4年7月～令和5年1月(7ヵ月)	新渡り廊下・プール増築			

■ 工事工程計画表																																										
	令和2年度												令和3年度												令和4年度																	
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1		2	3					
I 校舎棟増築工事				新職員室・多目的ホール・CR増築 I-①																																						
II 校舎棟既存改修工事																新昇降口増築 II-①												新EV増築 III-①											完成 引き渡し			
																管理棟A改修・高学年棟改修 II-②												管理棟B改修・低学年棟改修 III-②														
III 体育館棟既存改修工事																																	既存体育館改修 IV-①									
IV 既存解体工事				既存浄化槽解体 I-②																						既存油タンク・電気室・プール解体 IV-②																
渡り廊下・プール工事																											新渡り廊下・新プール増築 IV-③															
外構工事																												外構工事 VI-④														
校舎棟使用計画													高学年棟・職員引越し			仮配置使用						低学年棟・一部特別教室引越し			仮配置使用																最終 引越し	
備 考	・ 既存校舎の建築材料のアスベスト含有について調査が必要となります。 ・ 既存校舎の使用材料にアスベストが含まれる場合は工程の再検討が必要となります。																																									
																		村 田 弘 建 築 設 計 事 務 所 一級建築士事務所 知事登録 第17-10A-0460号										村田良太					DATE R01.11		PROJECT 藤里町立藤里義務教育学校 基本設計		TITLE 工事計画 工事工程計画表		SCALE S=NON		NO. 6-03	
